Retablering af Vestervadvej og Spangsbjerg Møllevej
Hovedtidsplan

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish
1					
2		**Udbud og kontrahering**	**18 days**	**Wed 27-11-24**	**Fri 20-12-24**
3		Udbudsperiode	11 days	Wed 27-11-24	Wed 11-12-24
4		Tilbudsfrist	0 days	Wed 11-12-24	Wed 11-12-24
5		Kontrahering	7 days	Thu 12-12-24	Fri 20-12-24
6		Kontrakt underskrevet	0 days	Fri 20-12-24	Fri 20-12-24
7					
8					
9		**Vestervadvej (Vej totalspærret)**	**28 days**	**Mon 20-01-25**	**Wed 26-02-25**
10		Rydnings- og opbrydningsarbejder	5 days	Mon 20-01-25	Fri 24-01-25
11		Retablering af bundopbygning og skråning	10 days	Mon 27-01-25	Fri 07-02-25
12		Ledningsarbejder	2 days	Mon 03-02-25	Tue 04-02-25
13		Asfaltarbejder	2 days	Mon 10-02-25	Tue 11-02-25
14		Genopsætning af autoværn	2 days	Wed 12-02-25	Thu 13-02-25
15		Afsluttende arbejder	3 days	Fri 14-02-25	Tue 18-02-25
16		Spilddage	6 days	Wed 19-02-25	Wed 26-02-25
17					
18		**Spangsbjerg Møllevej (én vejbane åben - signaregulering)**	**41 days**	**Mon 13-01-25**	**Mon 10-03-25**
19		Rydnings- og opbrydningsarbejder	5 days	Mon 13-01-25	Fri 17-01-25
20		Retablering af bundopbygning	5 days	Mon 20-01-25	Fri 24-01-25
21		Ledningsarbejder	10 days	Mon 27-01-25	Fri 07-02-25
22		Brolægningsarbejder	15 days	Mon 27-01-25	Fri 14-02-25
23		Asfaltarbejder	5 days	Mon 17-02-25	Fri 21-02-25
24		Afsluttende arbejder	5 days	Mon 24-02-25	Fri 28-02-25
25		Spilddage	6 days	Mon 03-03-25	Mon 10-03-25
26					
27		Afleveringsforretning	0 days	Tue 11-03-25	Tue 11-03-25
28		**Færdiggørelsesfrist**	0 days	Tue 11-03-25	Tue 11-03-25

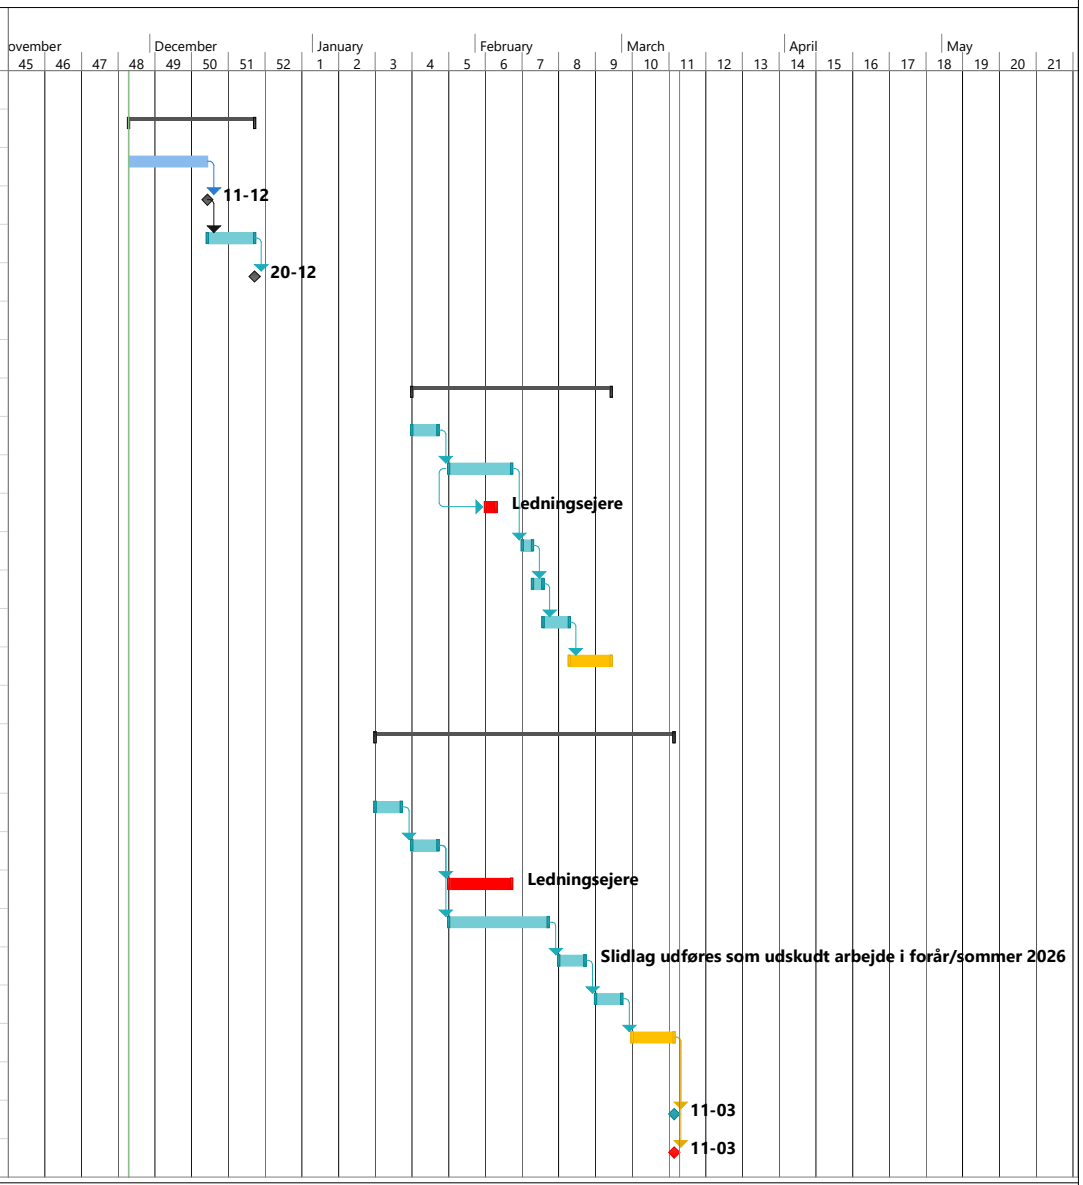

Dok. nr.: A290067-208
Ver: 1.0
Dato: 27.11.2024

Task		Project Summary		Manual Task		Start-only		Deadline	
Split		Inactive Task		Duration-only		Finish-only		Progress	
Milestone		Inactive Milestone		Manual Summary Rollup		External Tasks		Manual Progress	
Summary		Inactive Summary		Manual Summary		External Milestone			
